

بنام خدا

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما

موضوع: گزارش عملکرد ۳ ماهه اول سال ۹۹ پروژه دریا طبق قرارداد شماره ۲۳۹۱/۱۱۷۱

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و دستورات دولت مبنی بر توقف کارهای ساختمانی، پروژه از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ لغایت ۹۹/۰۲/۰۶ به حالت تعطیل درآمد.

لذا گزارش پیشرفت پروژه ساختمانی به شماره پرونده های ۲۲۰۰۱۴۴۲۱ و ۲۲۰۰۱۴۴۴۵ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

بلوک A (شمالی):

- پخش ورق سقف ۶-
- نصب نبشی زیر ورق عرشه سقفهای ۲- و ۳-
- سفت کاری پیچ های اتصالات اسکلت طبقه ۲-

بلوک B (جنوبی):

- ضد عفونی کارگاه، اتاقهای کارگری و کانکس ها بر اساس پروتکل بهداشتی.
- اخذ تعهد از پرسنل و پیمانکاران جهت رعایت و عمل به پروتکل های بهداشتی.
- خرید آهن آلات و متعلقات ساخت زیر پایی جهت تسریع در عملیات اجرایی دیوار برشی.
- برگزاری کلاسهای توجیهی ایمنی و بهداشت برای کارگران و پرسنل اجرایی.
- ساخت حدود ۶ تن متعلقات اسکلت (زیرسری و پیلت اتصال به دیوار برشی) و دیو در پروژه.
- تاج آپ اسکلت طبقات ۲+ و ۳+ و ۸+.
- تکمیل سقف های همکف و ۱+ و بتن ریزی آنها.
- بتن ریزی طبقات ۸+ و ۹+ دیوار برشی شمالی.
- بتن ریزی طبقه ۸+ دیوار برشی جنوبی.

انبوه بنا ایرانیان

شرکت ساختمانی و مجری
با مسئولیت محدود


تاریخ :
شماره :
پیوست :

شماره ثبت : ۳۱۵۵۷۸

- تکمیل اسکلت و تیریزی طبقات +۲ و +۳ .
- دو مرحله تست UT زیر سری های جوشکاری شده .
- نمونه گیری از بتن های مورد استفاده در دیوارهای برشی و سقف ها .

با احترام

شرکت ساختمانی

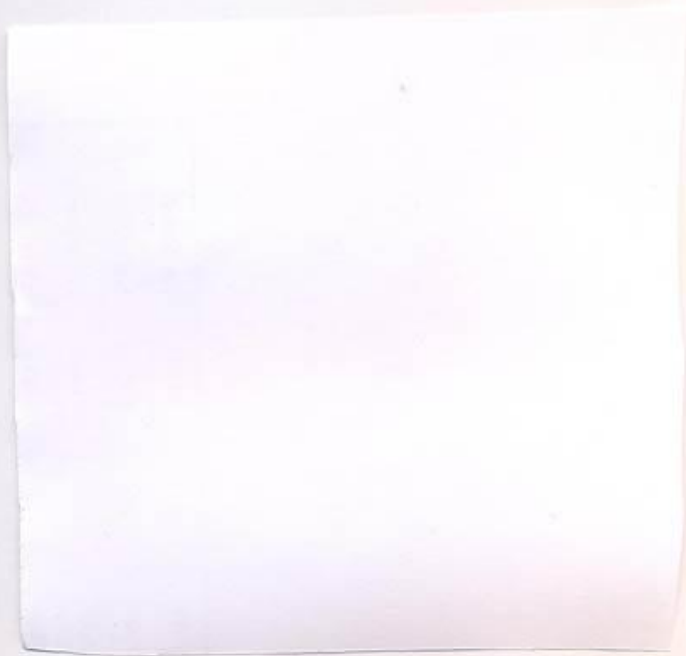




مجری انبوه‌نیا اکر استان
 پروانه اشتغال ۷-۱-۰۰۰۰۵۳
 نظام مهندسی ۱۰۰۳-ح-۵۲۷۵۵
 شهر سناری ۲۰۹-۰۰-۴۷۶



۱۵۰
 ۷-۱-۰۰۰۰۰۵۳
 ۱۰-۳-۰۵۳۲۵۴-ح
 ۲۰۹-۰۰۰۴۷۶
 پروانه اشتغال
 نظام مهندسی
 شهر ساری

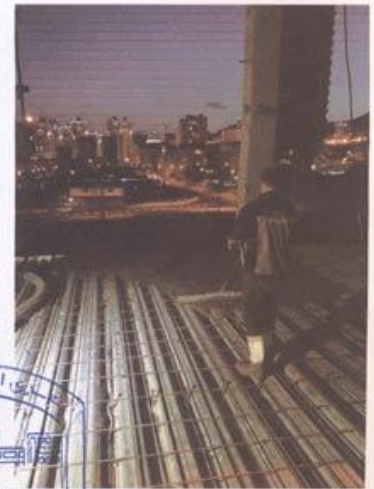

شرکت پیمانکاری، انجمنه پناه ایسرا انیمان
 پروانه اشتغال: ۵۲-۱-۷
 نظام مهندسی: ۵۲۲۵۲-ح-۱۰۰۲
 شهر سناری: ۴۷۶-۰۰۰-۲۹



شماره ۱۵ انبوه بلاء ایرانمان
 پروژه انکشافی
 نظام مهندسی ۵۲۲۹-ح-۱۰۰۳
 شماره بنیادی ۴۷۶-۰۰۰۳۹
