

تاریخ: ۹۶/۰۸/۰۱

شماره: ۱۶۱ - ۳۱۰ - ۹۶

پوست: خرد



به نام خدا



جناب آقای محمدی

مدیریت محترم عامل تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما


موضوع: گزارش پیشرفت هفتگی

با سلام

احتراماً، به پیوست گزارش هفتگی از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۲ لغایت ۹۶/۰۷/۲۸ جهت استحضار تقدیم حضورتان می گردد.

با تشکر
مدیر عامل
خانلو

رئیس هیئت مدیره
۹۶/۰۷/۲۸



پروژه برج مسکونی ۲۵ طبقه ی حکیم نظامی (صداوسیما)

موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ ۹۶/۰۷/۲۲ الی ۹۶/۰۷/۲۸

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنرکار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان



عملیات انجام شده:

سفت کاری:

- اجرای ریل گذاری و ریگلاژ آسانسور ضلع شرقی تا طبقه ۲۱
- اجرای سیمان آستر دیوار تباری های زیر زمین ۳-
- اجرای زیر سازی سقف کاذب طبقه ۲۱ واحد غربی و تکمیل آن
- اجرای عایق کاری بام طبقه ۱۷ ضلع غربی
- نظافت کف واحد ها
- حمل مصالح به طبقات

تاسیسات مکانیکی:

- اجرای لوله آب بارون طبقات ۱۸ الی ۲۱
- اجرای لوله های مسی کولر گازی طبقه ۱۲
- کندگی کاری محل عبور لوله های مسی روی دیوار طبقه ۱۳



نازک کاری:

- اجرای کاشی سرویس حمام مستر واحد A از طبقه ۱۷
- اجرای کاشی سرویس حمام مستر و توالت ایرانی واحد غربی طبقه ۱۸
- اجرای کاشی سرویس حمام مستر واحد شرقی طبقه ۱۸
- اجرای کاشی سرویس حمام مستر، مشترک و توالت ایرانی واحد شرقی طبقه ۱۹
- اجرای کاشی سرویس حمام مستر و توالت ایرانی واحد شرقی طبقه ۲۰
- اجرای سرامیک کف سالن، اتاق خواب و آشپزخانه واحد A-B از طبقه ۱۷
- اجرای سرامیک کف سرویس حمام مشترک واحد F از طبقه ۱۷
- اجرای لکه گیری و نرمه کشی دورتادور دیوار جان پناه بام طبقه ۱۷ الی ۲۱
- سقید کاری دیوار واحد D-E-F از طبقه ۱۷
- شروع سنگ کاری دیوار راه پله ضلع شرقی و تکمیل سنگ کاری طبقه اول و دوم
- اجرای گچ برگ اتاق خواب واحدهای F از طبقه ۹ و واحد C-D-E-F از طبقه ۱۱



سفت کاری:

ریل گذاری آسانور





سیمان کاری تیاری ۳-



نرمه کنسی دور دیوار جان پناه





عایق کاری بام



اجرای لوله مسی طبقه ۱۲





گاشی حمام مستر طبقه ۱۸






کاشی توالت ایرانی طبقه ۱۹





اجرای کاشی سرویس حمام مشترک طبقه ۱۹



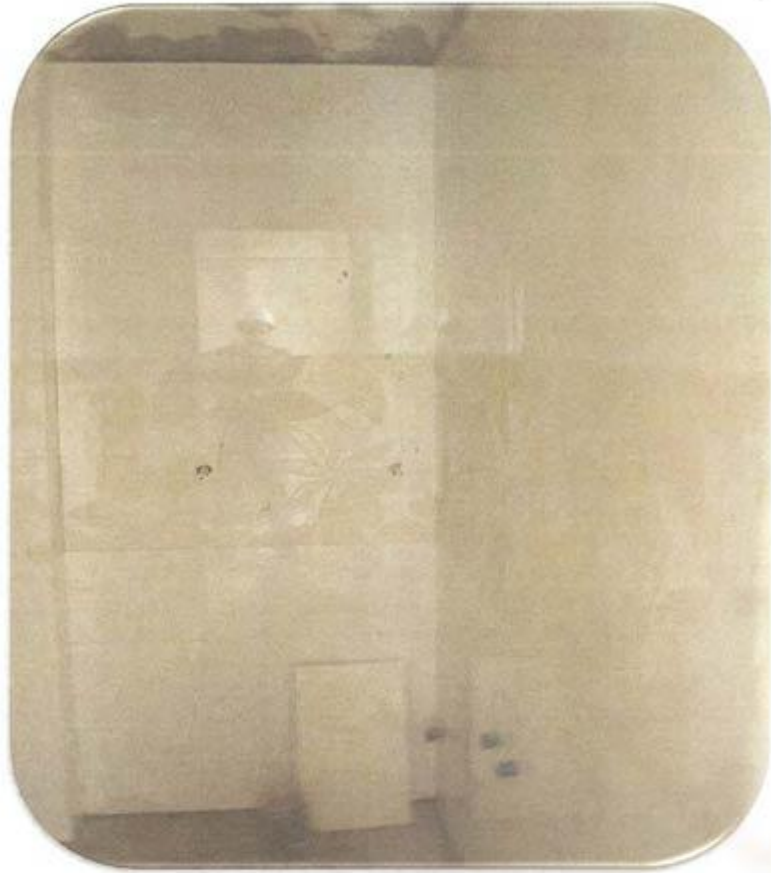

اجرای کاشی سرویس حمام مشترک طبقه ۱۶ واحد F



اجرای کاشی سرویس حمام مشترک طبقه ۱۶ واحد





