

تاریخ: ۹۷/۱۱/۰۴


شماره: ۴۳۵۵ - سب - ۹۶

پیوست: ندارد



شماره پیش: ۴۱۳۷۷۹

به نام خدا



جناب آقای محمدی

مدیریت محترم عامل تعاونی مسکن کارگنان صدا و سیما


موضوع: گزارش پیشرفت هفتگی

با سلام

احتراماً، به پیوست گزارش هفتگی از تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ لغایت ۹۷/۱۰/۳۰ جهت استحضار تقدیم حضورتان می‌گردد.

با تشکر

مدیر عامل



پیش
مدیر عامل

امدادیان جزویت بجهت پردازش

۱۱

شهری کلستان - بلوار امیر کبیر - بلوار هاشم زاده - ترمیده به اقلیا - پلاک ۱۸ - واحد ۱

تلفن: ۰۱۱۷۰۳۸۱۱ فکس: ۰۱۱۷۰۳۸۱۱



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پروژه برج مسکونی ۲۵ طبقه‌ی حکیم نظامی (صداويسیما)

موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ الی ۹۶/۱۰/۳۰

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنر کار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان

عملیات انجام شده:

سفت کاری:

اجرای عملیات پوشش ضد حریق در زیر زمین ۳-

نفافات کف واحدها

حمل مصالح به طبقات

تاسیسات مکانیکی:

نصب و ساپورت لوله های آتشستانی ضلع شرقی طبقات همکف الی ۹

نصب و ساپورت لوله های گاز ضلع شرقی طبقات همکف الی ۹

تاسیسات برقی:

عبور لوله و سیم برق برای اجرای چراغ هالوژن در طبقات ۸-۷

نازک کاری:

نصب درب های ورودی واحدها طبقات ۶ الی ۱۰

تکمیل سفید کاری سقف سالن و آشپزخانه واحد شرقی (مشغول کار در راهرو واحد)

اجرای سیمان سفید دیوارهای داخلی آسانسور طبقات ۳-۳ الی ۱۱

تکمیل سنگ نما پلخ غربی و مشغول کار در قسمت لابی

نصب نرده های راه پله پلخ غربی طبقات ۳-۳ الی همکف و ۱۳ الی ۱۶

جوشکاری حفاظ پله هلی پد پلخ شرقی و غربی

اجرای کاشی سرویس آشپزخانه واحد A از طبقه ۱

اجرای کاشی سرویس حمام مستر واحد A از طبقه ۱

اجرای کاشی سرویس توالت ایرانی واحد A از طبقه ۱

اجرای سرامیک کف سرویس حمام مستر واحد A از طبقه ۱

اجرای سرامیک کف سرویس توالت ایرانی واحد C-D-E از طبقه ۱

اجرای سرامیک کف سرویس توالت ایرانی واحد A-B-F از طبقه ۲

اجرای سرامیک کف سرویس توالت ایرانی کل واحدها در طبقات ۴-۵

اجرای سرامیک کف سرویس توالت ایرانی واحد شرقی و غربی از طبقات ۱۹-۱۸


سفت کاری:

اجرای پوشش ضد حریق زیرزمین -۳






اجرای لوله های گاز و آتشنشانی

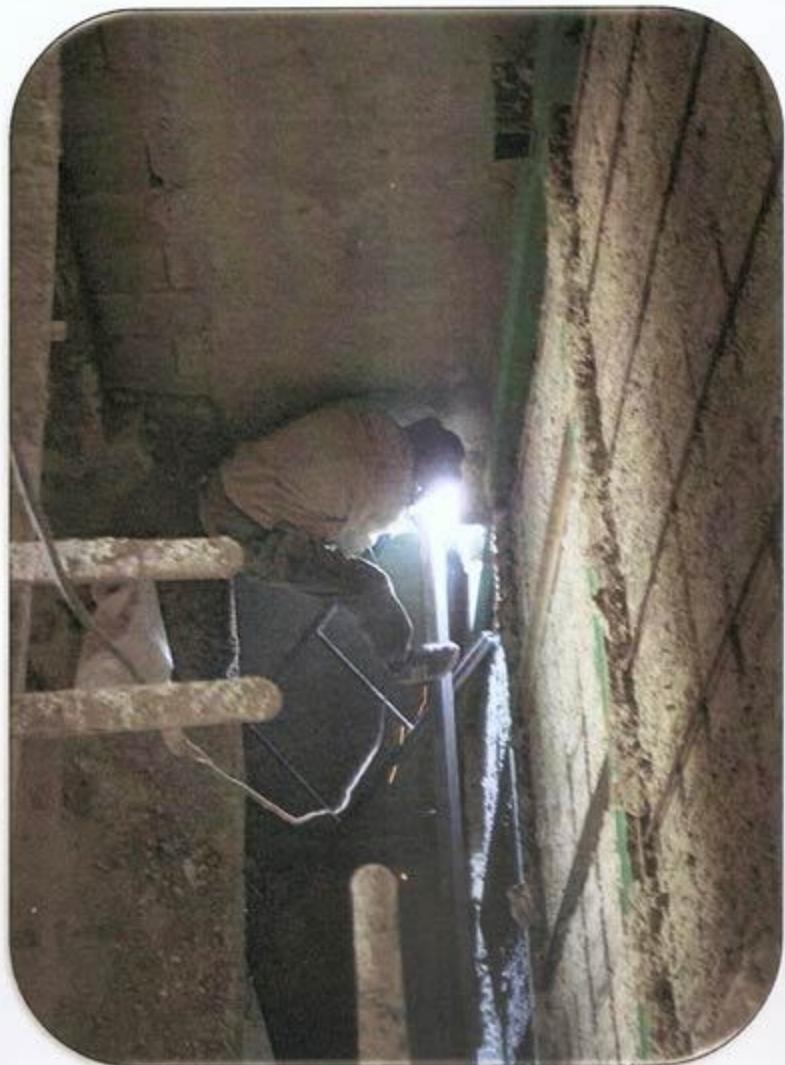

ل

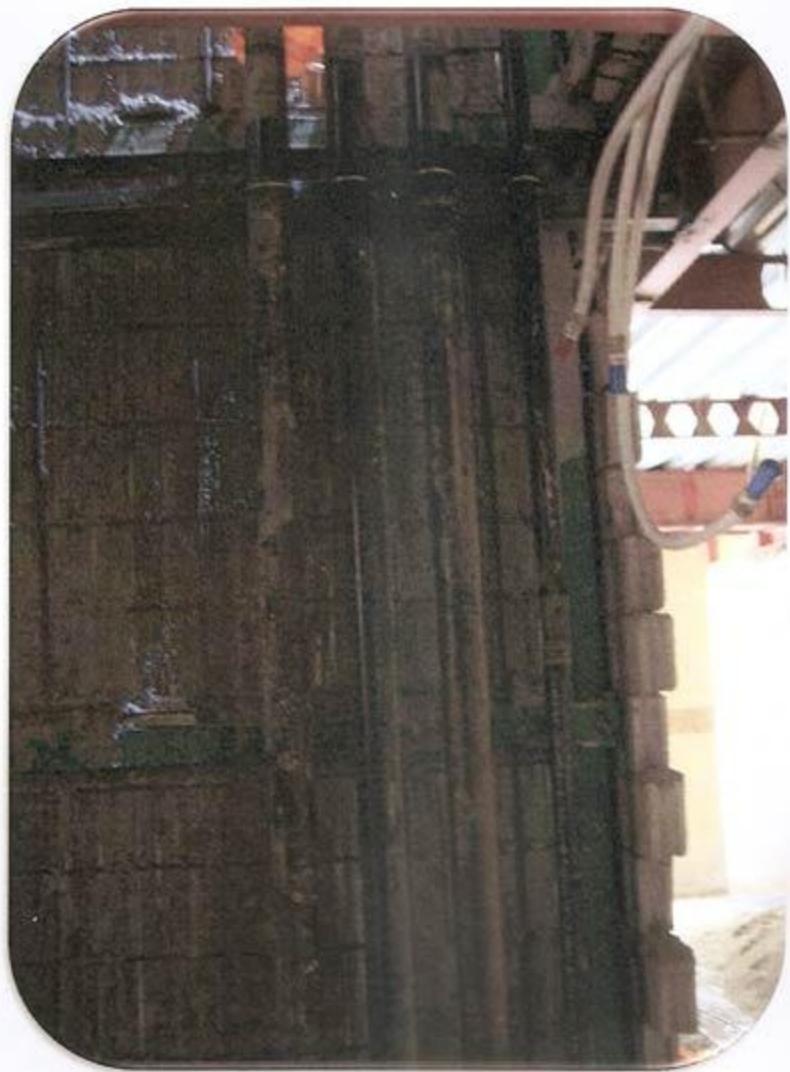




میور لوله و سیمه برای اجرای چراغ هالوژن





نصب درب ورودی واحدها طبقه ۱۰

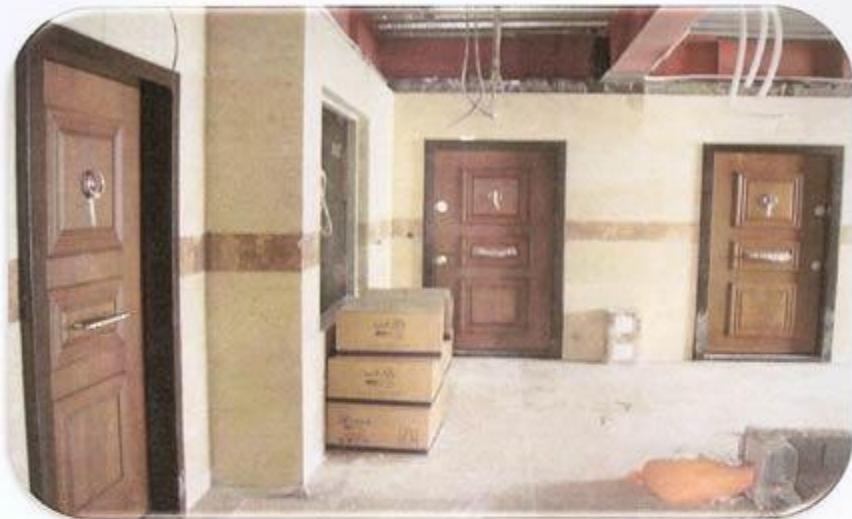




سفید کاری سقف سالن و آشپزخانه طبقه ۲۱



ستك نماضج غربي ولاي

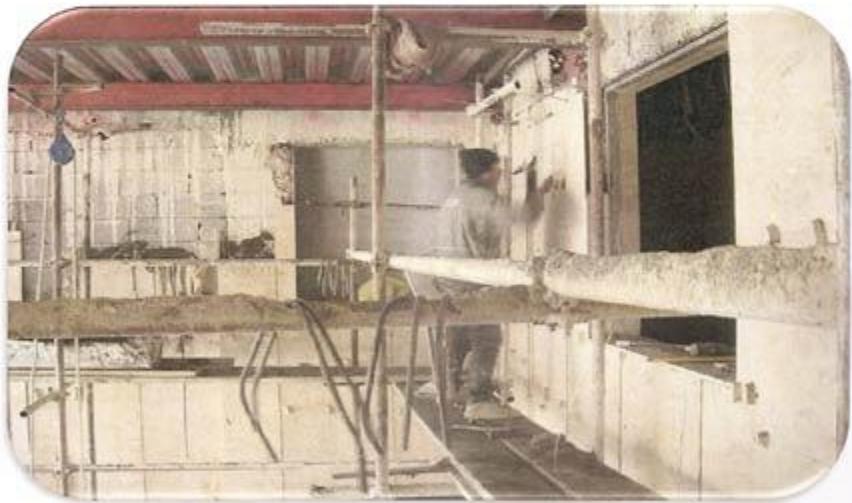

نصب تردد راه پله زیرزمین -۳





نصب تردد راه پله طبقه ۱۶

نصب نردہ هلی پد



اجرای کاشی و سرامیک حمام مستر واحد A طبقه ۱

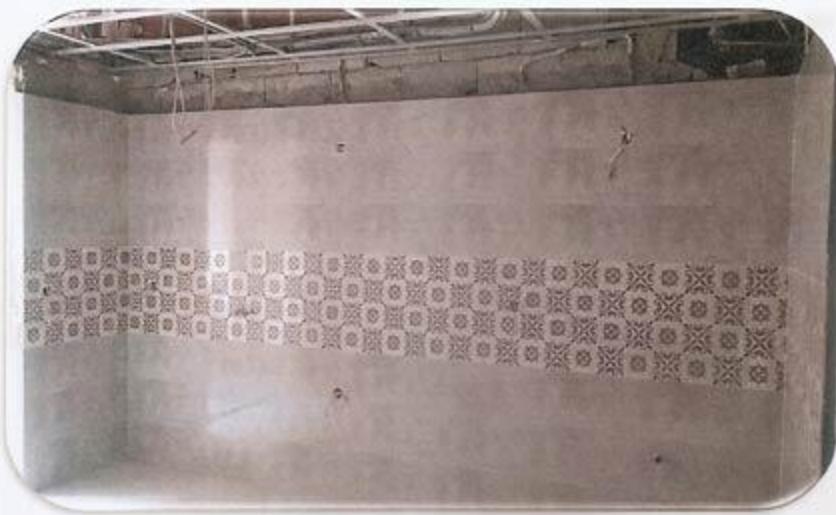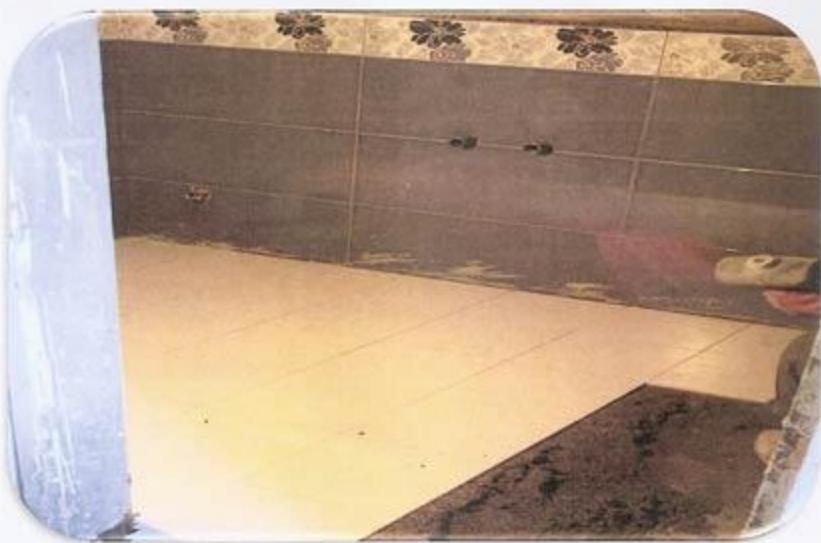

اجرای کاشی آشپزخانه واحد A طبقه ۱



اجرای سرامیک و سنگ توالی ایرانی

